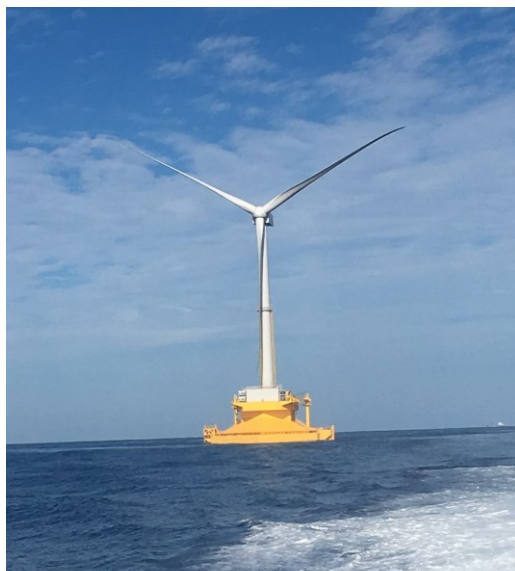

福島浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業 研究通信

2016年11月7日 ~vol.3~
福島洋上風力コンソーシアム



ふくしま浜風

◇ 稼働状況

- ✓ 「ふくしま未来」2MW 風車：2016年9月の実績は、設備利用率 23.8%、設備の利用可能率 95.9%、月平均風速 5.5m/s、10月の実績は、設備利用率 30.3%、設備の利用可能率 99.6%、月平均風速 6.2m/s
- ✓ 「ふくしま新風」7MW 風車：予防保全のために、6月17日より稼働を停止中

◇ 第2期工事進捗

- ✓ 「ふくしま浜風」5MW 風車は、送電ケーブルの敷設工事を終了し、現在コミッショニング中

◇ 漁業関係

- ✓ 漁業者の方々と浮体周辺における操業についての意見交換を行っています。

◇ 今後の予定

- ✓ 11月24日に、第1回事業化委員会&第2回技術委員会を開催します。

◇ その他

- ✓ 第5回ふくしま復興再生可能エネルギー産業フェアが10月19、20日に福島県郡山市で開催され、福島洋上風力コンソーシアム展示ブースには2日間で約1230の方が来場しました。

お問い合わせ先： 丸紅(株) 国内電力プロジェクト部 担当：菅井
